


新獣舎整備計画

令和4年1月



101計画と新獣舎整備計画

101計画の獣舎整備計画を独法体制で再検討⇒ 新獣舎整備計画を策定

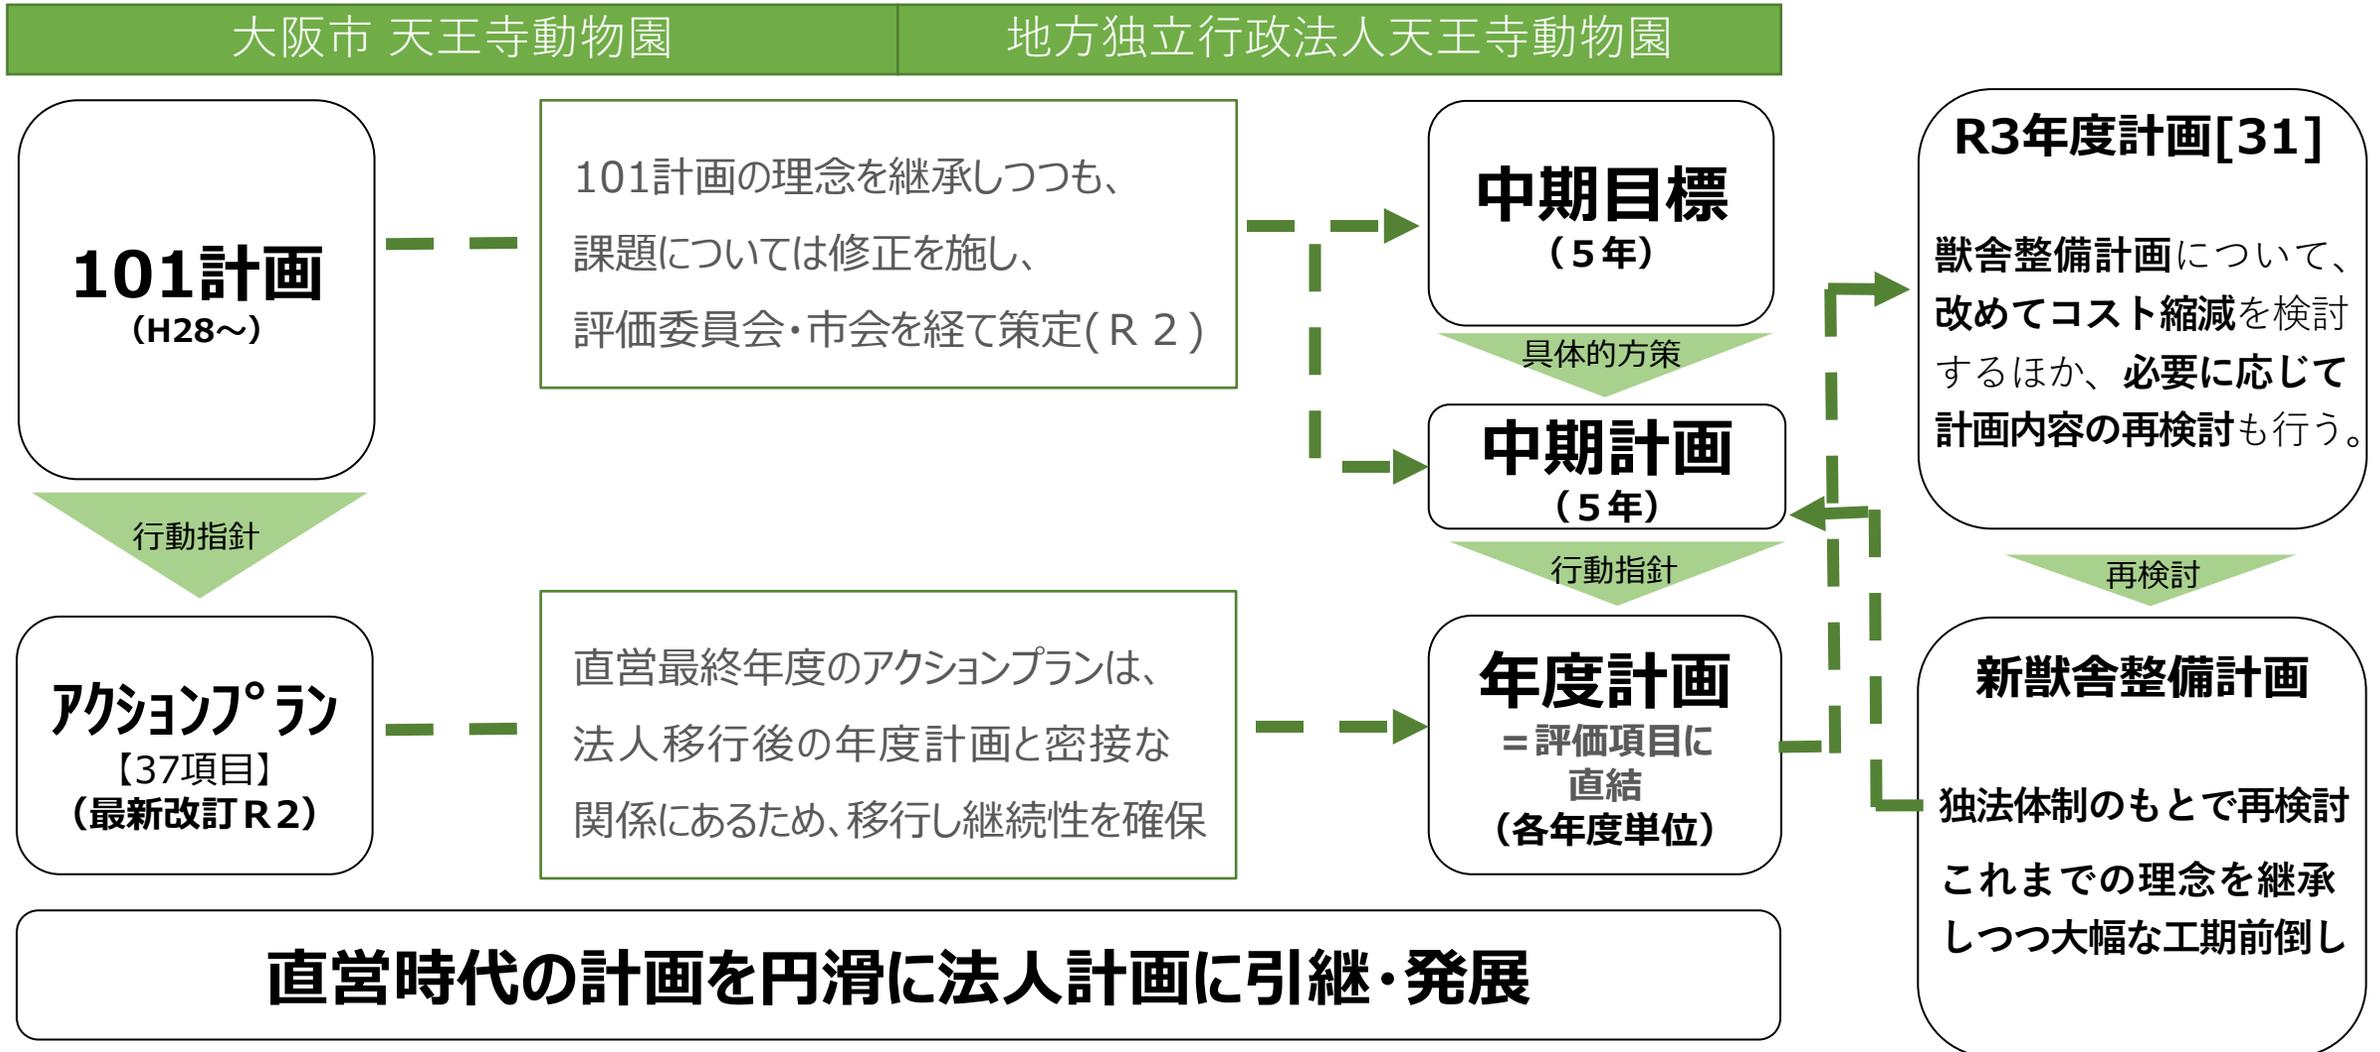

新獣舎整備計画の基本的な考え方

1 101計画の基本的な考え方は継承

- 進化型生態展示（生息環境と展示効果の両立）
- ゾーニングの考え方（海洋・森・草原・空）
「生息地別展示配列」と「動物行動学的テーマ」のリンク

2 新園長のもとで、新たな整備計画を策定

- 万博に向け「世界に誇れる動物園」に相応しい獣舎整備計画を立案⇒ **事業費概算92億円は維持**
- 令和8年以降に計画した事業の6割を万博までに前倒し、計画の9割弱が完了（事業費ベース）
- 発注ロットの大型化による整備費削減効果も期待
- 残工事(13億円)の8割がバックヤード、病院など基礎研究、繁殖を支える施設であり、R8以降着実に整備をすすめる。


(図)101計画と新計画との関係イメージ

市直営	法人移行後
101計画	新計画 大阪万博に向け 世界に誇れる動物園に相応しい 獣舎整備計画を立案
(進化型生態展示) (ゾーニング)	
100億	92億

前倒しの効果

1 生態的展示の施設が急増

- 現状では、サバンナ、アイファア、鳥楽のみ
- 万博を迎えるR7に園内施設の大半が生態的展示に

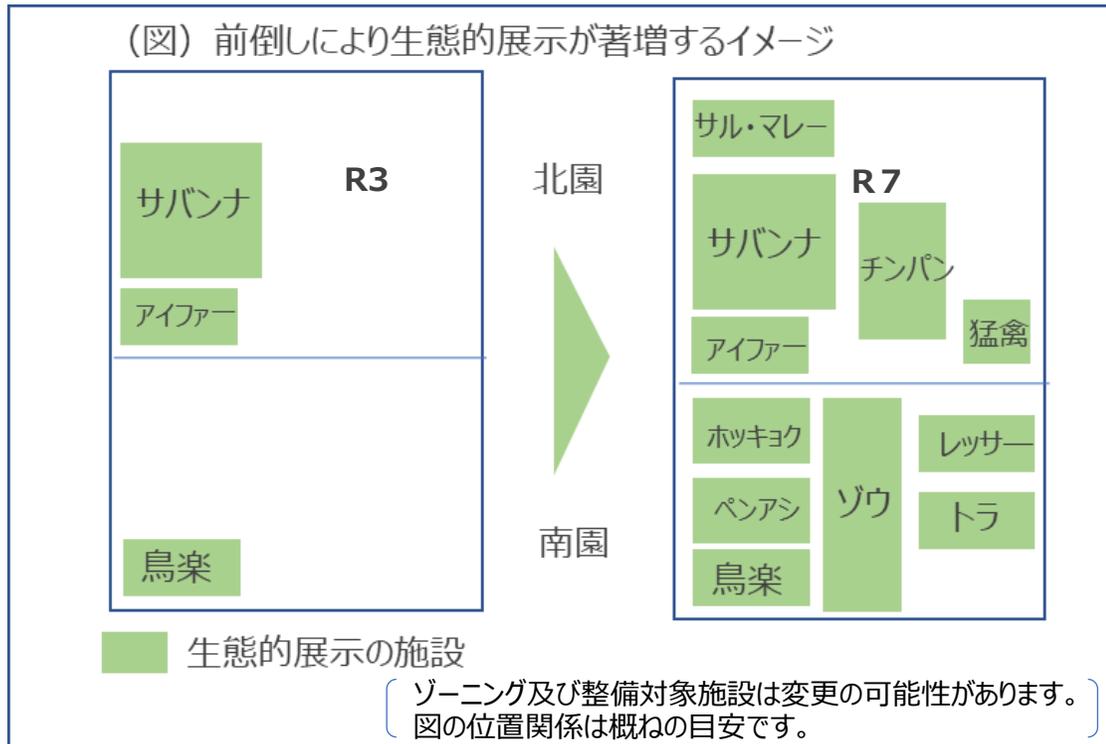

2 発注ロットの増大による整備費縮減効果

- 前倒しにより発注ロットの増大 (23億⇒46億)
⇒請負率の低下 (過去の落札率による分析平均で5%削減)
※縮減分は、動物福祉基準を満たすための獣舎面積拡張等に充当

(表1) R4予算要求時の20年シミュレーション

	直営時代	第1期 R3~R7	第2期~ R8~R22	合計
獣舎整備計画 H29~R22	1,482	6,426 (4,640)	1,322 (1,322)	9,230

(表2) R3当初の20年シミュレーション

	直営時代	第1期 R3~R7	第2期~ R8~R22	合計
獣舎整備計画 H29~R22	1,527	4,095 (2,309)	3,608 (3,608)	9,230

〔 () 書きは、動物園発注分整備費 〕

獣舎整備は動物園の魅力向上に重要なものであるが、一方で多額の経費を要するため、発注方法の工夫による整備費の縮減のみならず、動物園に求められる役割の変化や時代の推移に応じた獣舎整備計画の見直し、ファンドレイジングによる新たな財源確保等も含め、継続して検討する。

工程（イメージ）

第1期中期経営計画期間

第2期

第3期

第4期

計

単位：百万円			～R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8～12	R13～17	R18～22	計	
	ゾーン	飼育動物	概算事業費	1,482	374	1,999	1,127	2,279	647	407	434	481	9,230
	～R2		1,482										
①	ふれあい家畜	ヒツジ・ヤギ	216	←————→									
②	ペンギン・アシカ		1,569	←————→									
③	ホッキョクグマ舎		1,149	←————→									
④	適応の世界	キジ	212		←————→				←-----→				
⑤	アジアの森	ゾウ	995		←————→				←-----→				
⑥	新猛禽舎	ニホンイヌワシ	196		←————→					←-----→			
⑦	夜行性動物舎	コウモリ	191		←————→				←-----→				
⑧	アフリカの森	チンパンジー	733	←————→		←————→				←-----→			
⑨	日本の里	ニホンジカ	285	←————→									
⑩	タイガの森	アムールトラ	210		←————→					←-----→			
⑪	樹上の森	フクロテナガザル	437		←————→				←-----→				
⑫	休憩エリア		86		←————→								
⑬	アジアの高地	レッサーパンダ	140		←————→				←-----→				
⑭	動物病院等		280		←————→				←-----→				
⑮	休憩エリア		68							←————→			
⑯	総合案内など		347							←————→			
⑰	新ツル舎	ナベツル	138								←————→		
⑱	バックヤード		135								←————→		
⑲	南米の森	ジャガー	148								←————→		
⑳	バックヤード		213								←————→		
計			9,230										

一体整備

凡 例

- ←————→ 実工期
- ←————→ 前倒し工期
- ←-----→ 前倒し前の工期

※工期はイメージで変更することがあります。
